FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER

Hovedtidsplan
Pilotprojekt – Hedelyngen

Dato: 24.02.2021
Rev. : xx.xx.xxxx
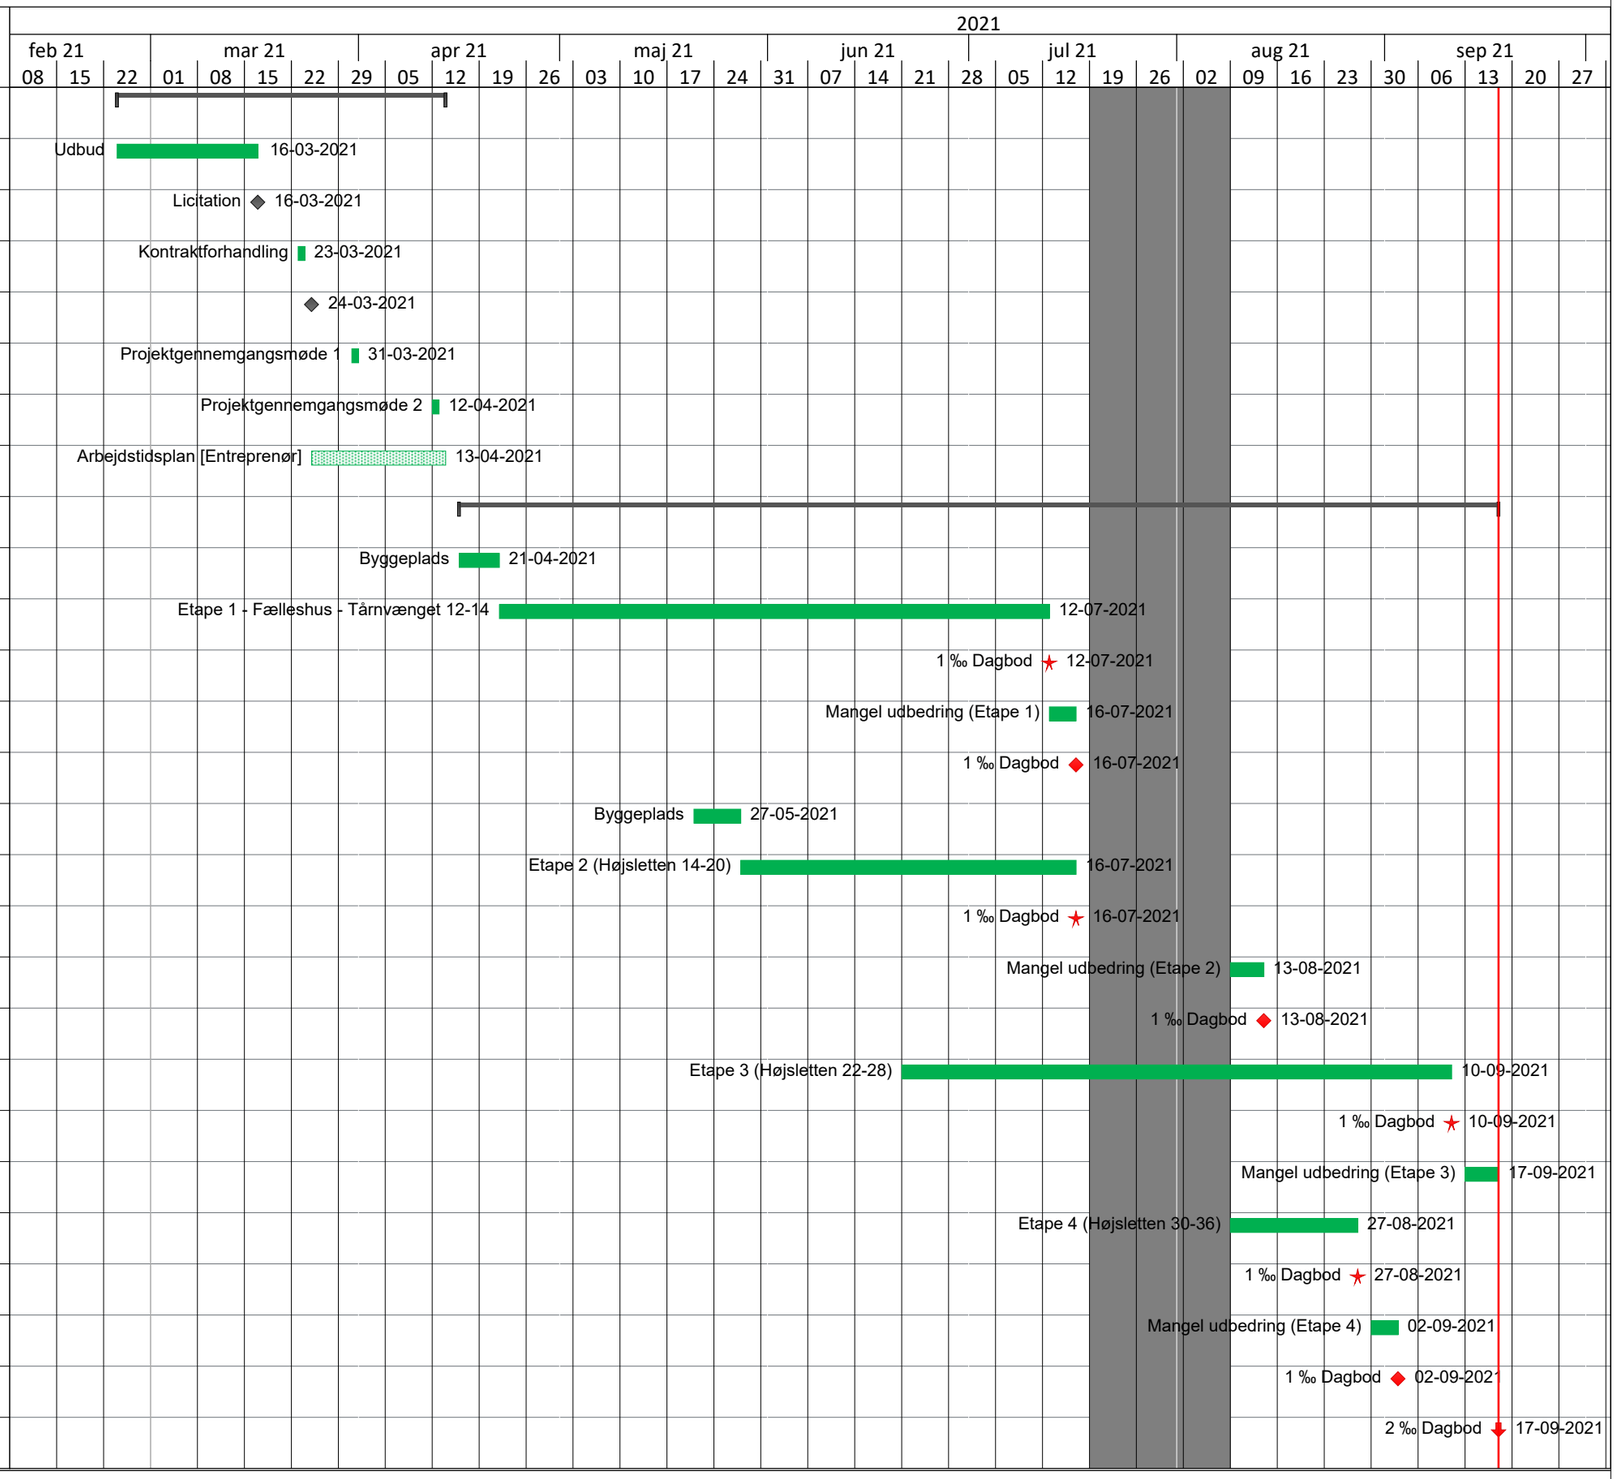
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato
1	**Udbud og kontraherinng**	**32 dage**	**on 24-02-21**
2	Udbud	15 dage	on 24-02-21
3	Licitation	0 dage	ti 16-03-21
4	Kontraktforhandling	1 dag	ti 23-03-21
5	Kontrahering	0 dage	on 24-03-21
6	Projektgennemgangsmøde 1	1 dag	on 31-03-21
7	Projektgennemgangsmøde 2	1 dag	ma 12-04-21
8	Arbejdstidsplan [Entreprenør]	11 dage	to 25-03-21
9	**Udførsel**	**93 dage**	**fr 16-04-21**
10	Byggeplads	4 dage	fr 16-04-21
11	Etape 1 - Fælleshus - Tårnvænget 12-14	55 dage	to 22-04-21
12	Mellemtermin (Etape 1)	0 dage	ma 12-07-21
13	Mangel udbedring (Etape 1)	4 dage	ti 13-07-21
14	Mellemtermin for mangeludbedring (E1)	0 dage	fr 16-07-21
15	Byggeplads	4 dage	fr 21-05-21
16	Etape 2 (Højsletten 14-20)	36 dage	fr 28-05-21
17	Mellemtermin (Etape 2)	0 dage	fr 16-07-21
18	Mangel udbedring (Etape 2)	5 dage	ma 09-08-21
19	Mellemtermin for mangeludbedring (E2)	0 dage	fr 13-08-21
20	Etape 3 (Højsletten 22-28)	45 dage	ma 21-06-21
21	Mellemtermin (Etape 3)	0 dage	fr 10-09-21
22	Mangel udbedring (Etape 3)	5 dage	ma 13-09-21
23	Etape 4 (Højsletten 30-36)	15 dage	ma 09-08-21
24	Mellemtermin (Etape 4)	0 dage	fr 27-08-21
25	Mangel udbedring (Etape 4)	4 dage	ma 30-08-21
26	Mellemtermin for mangeludbedring (E4)	0 dage	to 02-09-21
27	Dagbodsudløsende AB18 aflevering	0 dage	fr 17-09-21
